TryAI Gap

Avance Proyecto APT · Fase 2

Plataforma SaaS multitenant para evaluación de madurez en adopción de IA

Equipo

Andrew Sandoval

Liderazgo · QA/seguridad · coordinación

Vicente Cerda

Frontend · UI · rebranding

Adoniss Riquelme

Backend · APIs

Benjamín Abarca

Base de datos · infraestructura/integraciones

Sección: 300D · Docente: CLAUDIA GABRIELA REINOSO HURTADO

Repositorio: https://github.com/Ad0niz/TryAI_GAP

CAPSTONE · HITO 2

02

Abstract · ES / EN


ESPAÑOL

TryAI Gap es una plataforma SaaS multitenant orientada a evaluar el nivel de madurez de una organización para adoptar inteligencia artificial. Durante la segunda fase del proyecto, el enfoque se ajustó desde un desarrollo completo desde cero hacia la mejora y finalización de una solución existente. El trabajo se ha concentrado en estabilizar la aplicación, corregir errores, validar la integración entre frontend, backend y base de datos, mejorar la seguridad y completar funcionalidades pendientes. Actualmente se avanza en rebranding, configuración organizacional, autenticación, resultados y pruebas, manteniendo una planificación incremental y seguimiento mediante Carta Gantt, GitHub y CoreStream.

ENGLISH

TryAI Gap is a multitenant SaaS platform designed to assess an organization’s maturity and readiness for artificial intelligence adoption. During the second project phase, the approach changed from building the solution entirely from scratch to improving and completing an existing application. The team has focused on stabilizing the system, fixing defects, validating frontend, backend and database integration, strengthening security and completing pending features. Current work includes rebranding, organizational settings, authentication, results and testing. Progress is managed incrementally through the project Gantt chart, GitHub and CoreStream, allowing the team to reprioritize work while maintaining a demonstrable deployed version of the product.

03 Recordatorio del proyecto

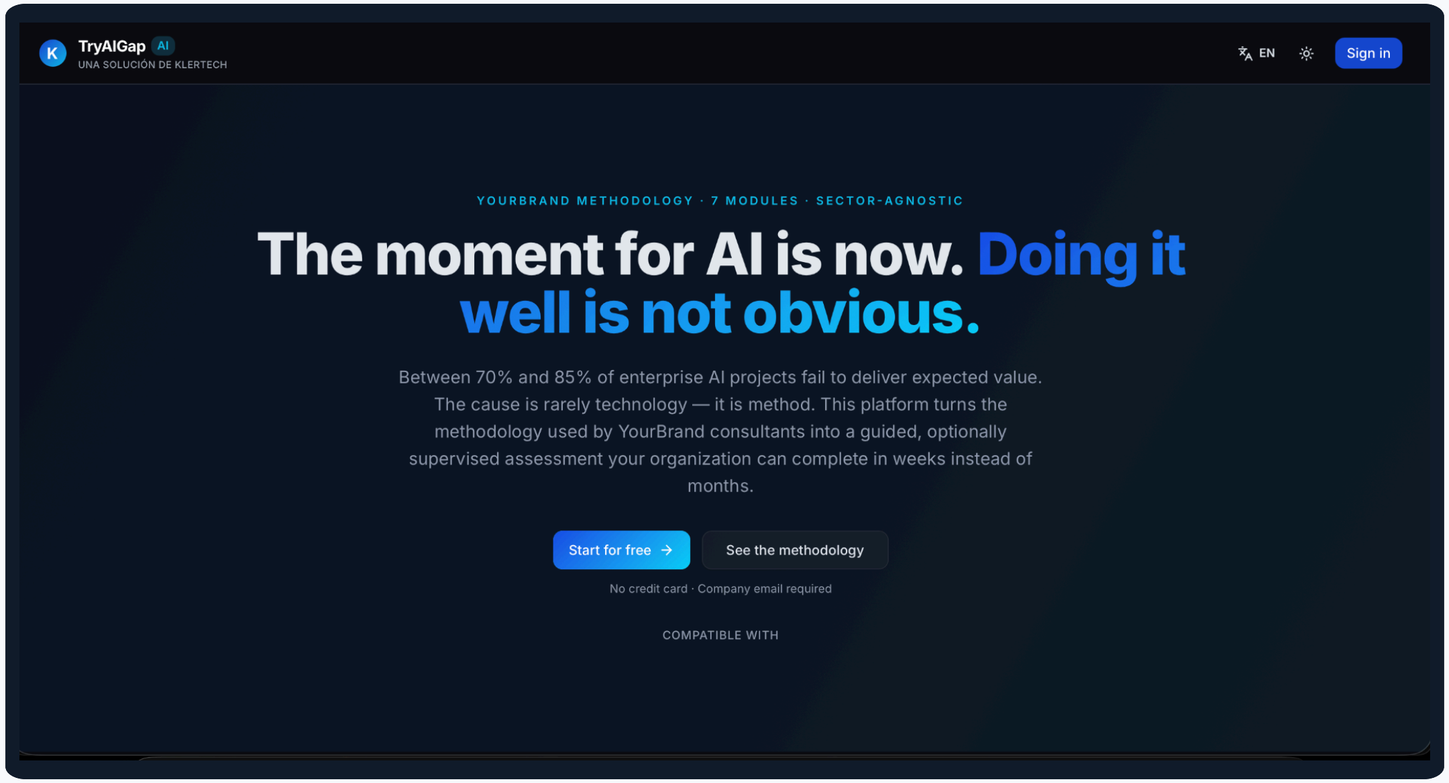

PROBLEMA

Organizaciones quieren adoptar IA, pero no siempre cuentan con una forma estructurada de medir preparación, brechas y prioridades.

OBJETIVO

Mejorar, completar y validar TryAI Gap como plataforma SaaS multitenant estable, funcional y demostrable.

USUARIOS

Organizaciones, equipos directivos, participantes del diagnóstico y consultores.

MVP

Autenticación, organización/tenant, diagnóstico, respuestas persistentes, resultados, colaboración, evidencias y reporte ejecutivo.

04

Retroalimentación Fase 1 y ajustes

Observación recibida	Ajuste realizado	Origen	Justificación
Scrum estaba definido, pero no operacionalizado	Se detalló duración de sprints, roles, artefactos y ceremonias; seguimiento mediante CoreStream y Carta Gantt	Retroalimentación docente	Evitar retrabajo y concentrar el semestre en necesidades reales del producto.
El proyecto fue inicialmente planificado como desarrollo desde cero	Se reformuló el plan hacia mejora, corrección y validación de una plataforma existente	Dificultad	El estado real de la solución requería adaptar las actividades
El sistema ya tenía frontend, backend y base de datos para desplegar.	Se adelantaron validaciones de integración, persistencia y multitenancy.	Facilitador	Permitió obtener evidencia funcional antes de lo planificado.
Autenticación depende de componentes compartidos con Administración.	Se dejó el bloque en espera y se avanzó en paralelo con rebranding y configuración organizacional.	Dificultad	Mantener avance sin intervenir contratos compartidos sin coordinación.

05

Metodología aplicada

Scrum adaptado · trabajo incremental sobre una solución existente

1 **Revisar**
Código, requerimientos y comportamiento actual

→

2 **Priorizar**
Gantt, CoreStream y dependencias

→

3 **Implementar / corregir**
Cambios pequeños y desplegables

→

4 **Validar**
Pruebas funcionales y revisión del resultado

EVIDENCIAS DE APLICACIÓN

Carta Gantt
Planificación y reajustes por hito

CoreStream
Épicas y tickets del desglose técnico

GitHub
Control de versiones y cambios

Vercel + Render
Versión demostrable desplegada

Nota: el seguimiento actual se apoya principalmente en Gantt + CoreStream; no se presenta burndown porque no existe un registro formal consolidado.


06

Estado del plan de trabajo

Revisión de alcance y backlog	Completado	Plan reformulado a solución existente
Rebranding Klertech	Completado	Trabajo activo de interfaz e identidad
Login, recuperación y 2FA	Con retraso	Dependencia con equipo Administración
Configuración organizacional	Completado	Implementación visible
Diagnóstico / persistencia	En curso	Se valida sobre funcionalidad existente
Resultados reales y dashboards	No iniciado	Programado después de bloques prioritarios

07

Arquitectura actual

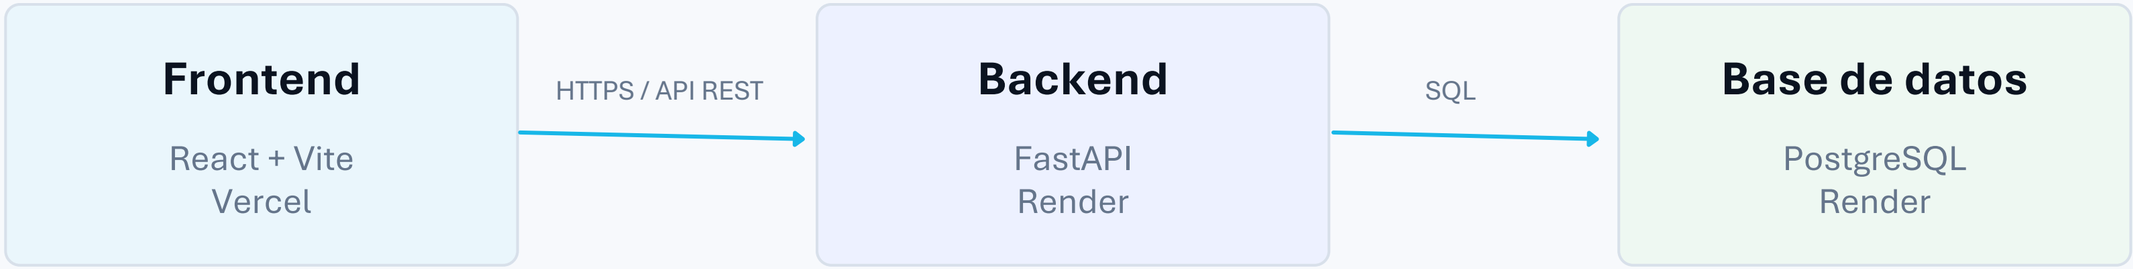

Autenticación compartida

JWT · coordinación con Administración

Correo / integraciones

Recuperación · 2FA · invitaciones


Docker / Azure

Pendiente dentro del plan Hito 2

Estado actual: frontend y backend desplegados; Dockerización aún no se comienza.

08

Modelo de datos implementado

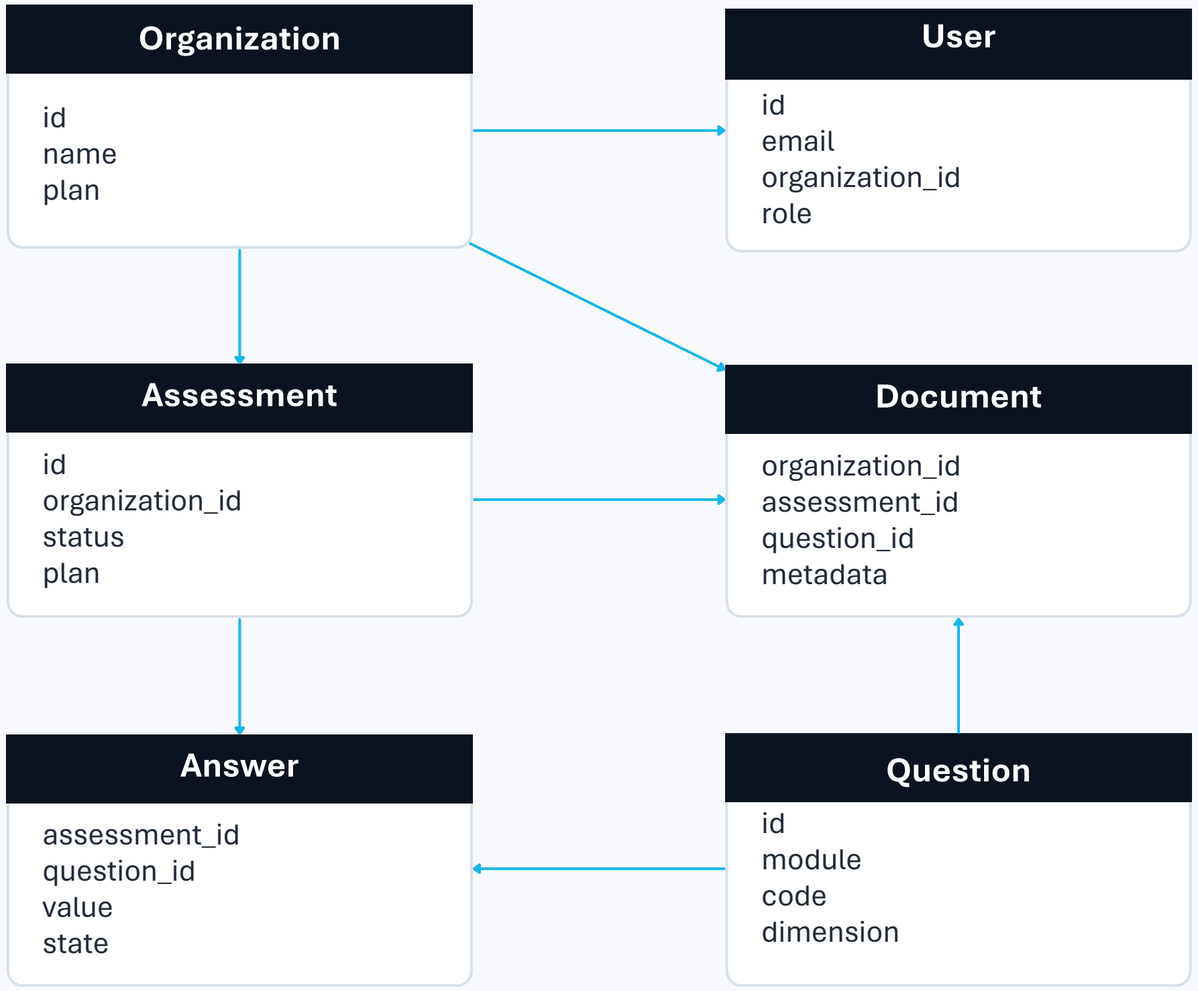


EVIDENCIA

- PostgreSQL desplegado en Render
- Modelo implementado en SQLAlchemy
- Relaciones con claves foráneas activas
- Persistencia por organización validada
- Datos organizacionales consumidos desde API
- Seeds disponibles para preguntas y datos iniciales

09

Funcionalidades desarrolladas

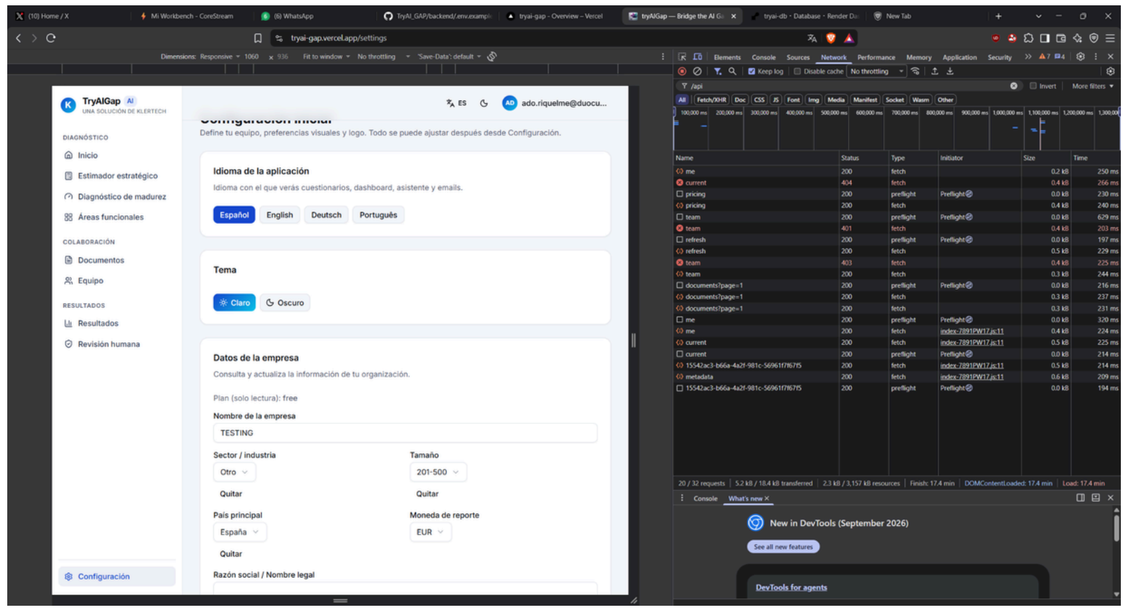

IMPLEMENTADO / VALIDADO

- Frontend y backend desplegados
- Persistencia de datos en PostgreSQL
- Aislamiento multitenant validado
- Diagnóstico y progreso persistente
- Configuración organizacional en Settings
- Rebranding en ejecución

EN CURSO / PENDIENTE

- Contraseña, recuperación y 2FA
- Resultados reales y dashboards
- Free parcial / paywall
- Invitaciones, revisiones y hardening

[Completar 28 de 34 tickets]

Documentación producida

Requerimientos funcionales

Fuente de alcance y validación

Carta Gantt + desglose técnico

Plan actual y seguimiento por hito

CoreStream

Épicas y tickets trazables

Informe Fase 1

Objetivos, metodología y plan original

Auditoría técnica Hito 1

Hallazgos de seguridad y calidad

README / documentación repo

Revisar y completar antes de cierre

Trazabilidad: requerimiento → actividad Gantt → épica/ticket → cambio implementado → evidencia visual.

Calidad y estándares

Validaciones funcionales

Persistencia, sesión, diagnóstico y tenant

Control de versiones

Git/GitHub para cambios del proyecto

Despliegues verificables

Vercel + Render como entorno demostrable

DEUDA DE CALIDAD

Pruebas unitarias

No existe aún evidencia formal consolidada

Plan de pruebas

Debe documentarse para el cierre

PR / ramas / linter


Verificar y estandarizar en repositorios

Repositorio Git

Estructura

```
TryAI_GAP/
├─ backend/
│   ├─ app/
│   ├─ migrations/
│   ├─ tests/
│   ├─ Dockerfile
│   ├─ docker-compose.yml
│   └─ README.md
├─ web/
├─ FASE 1/
├─ REFLEXIONES FASE 1/
├─ REFLEXIONES FASE 2/
├─ README.md
├─ logo-tryai.svg
└─ .gitignore
```

README	Objetivo, instalación, variables, ejecución y enlaces
Ramas	Mostrar estrategia real utilizada
Nombres	Mantener estructura consistente y comprensible
URLs	https://github.com/Ad0niz/TryAI_GAP

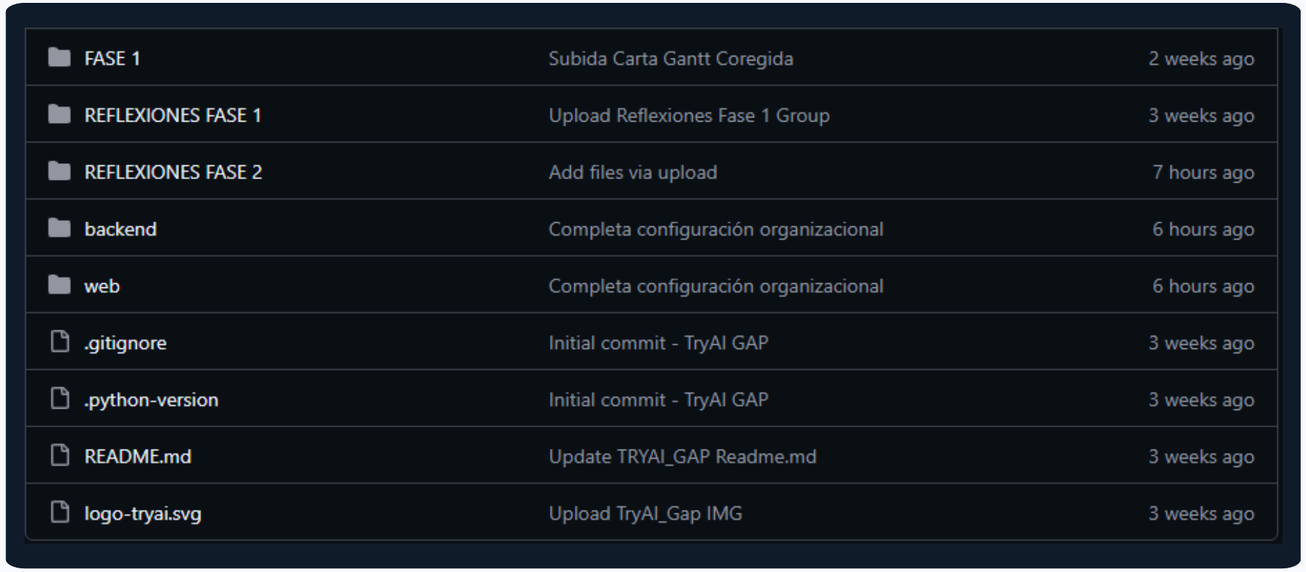

FASE 1	Subida Carta Gantt Coregida	2 weeks ago
REFLEXIONES FASE 1	Upload Reflexiones Fase 1 Group	3 weeks ago
REFLEXIONES FASE 2	Add files via upload	7 hours ago
backend	Completa configuración organizacional	6 hours ago
web	Completa configuración organizacional	6 hours ago
.gitignore	Initial commit - TryAI GAP	3 weeks ago
.python-version	Initial commit - TryAI GAP	3 weeks ago
README.md	Update TRYAI_GAP Readme.md	3 weeks ago
logo-tryai.svg	Upload TryAI_Gap IMG	3 weeks ago

Aporte por integrante

Integrante	Módulo / rol actual	Commits	PRs	Issues
Andrew Sandoval	Liderazgo · QA/seguridad · coordinación	**7**	**1 (#2)**	**0**
Vicente Cerda	Frontend · UI · rebranding	**5**	**2 (#1 y #3)**	**0**
Adoniss Riquelme	Backend · APIs	**6**	**1 (#4)**	**0**
Benjamín Abarca	BD · infraestructura / integraciones	**0 visibles**	**[PR]**	**0**

Riesgos y plan al informe final

01	**Dependencia de autenticación**	Bloqueo por contrato compartido con Administración	Acordar endpoint/modelo/roles y avanzar en paralelo con módulos independientes
02	**Coordinación entre actividades**	Algunas tareas presentan dependencias y ritmos de avance distintos.	Ajustar prioridades, redistribuir actividades cuando sea necesario y realizar seguimiento periódico mediante CoreStream.
03	**Calidad poco documentada**	No existe evidencia formal consolidada de pruebas	Crear plan de pruebas, automatizar casos críticos y registrar resultados

COMPROMISO HACIA SEMANA 15

Cerrar rebranding y configuración organizacional, destrabar autenticación, avanzar en resultados reales y dejar pruebas/documentación reproducibles.

Individual conclusions

A **Andrew**

“This phase showed me that leadership is not only planning; it is also adapting the plan when the real project changes.”

V **Vicente**

This phase strengthened my frontend skills by sharpening TypeScript management, internationalization, and corporate design standards.

A **Adoniss**

This phase strengthened backend reliability by reinforcing API contracts and ensuring seamless deployment synchronization.

B **Benjamín**

During this phase, we focused on stabilizing and completing the existing platform, achieving important progress in integration and persistence, while authentication, results, and testing remain the main pending areas.

Preguntas

TryAI Gap · Capstone Fase 2

GRACIAS!

Enlaces

- Github: Enlace a Github
- Gantt: Enlace a Drive
- Aplicación desplegada: tryai-gap.vercel.app
